Обособена позиция №1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"

ID	Етап/Фаза/Дейност	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка	Ресурси
939	**Възстановителни работи - кл. 23**	**8 days**	**Sun 6.3.22**	**Sun 13.3.22**	**928**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
940	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sun 6.3.22	Sun 13.3.22	928	Екип "Подготовка на трасе"
[illegible]1	Възстановителни работи	6 days	Sun 6.3.22	Fri 11.3.22	940FS-8 days	Екип "Възстановителни работи"
[illegible]	Проби и изпитания	2 days	Sat 12.3.22	Sun 13.3.22	941	Екип "Проби и изпитания"
[illegible]43	**Кл.24 DMA 6 рек.**	**5 days**	**Sun 13.3.22**	**Thu 17.3.22**	**932**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
944	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Sun 13.3.22	Thu 17.3.22	932	Ръководител на работна група (звено)
945	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	2 days	Sun 13.3.22	Mon 14.3.22	944FS-5 days	Екип "Подготовка на трасе"
946	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	3 days	Sun 13.3.22	Tue 15.3.22	945FS-2 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
947	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	3 days	Sun 13.3.22	Tue 15.3.22	946FS-3 days	Екип "Монтажни работи"
948	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	2 days	Mon 14.3.22	Tue 15.3.22	947FS-2 days	Екип "Обратно засипване"
949	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Wed 16.3.22	Thu 17.3.22	948	Екип "Проби и изпитания"
[illegible]	**Възстановителни работи - кл. 24**	**5 days**	**Mon 14.3.22**	**Fri 18.3.22**	**943FS-4 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
[illegible]	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	5 days	Mon 14.3.22	Fri 18.3.22	943FS-4 days	Екип "Подготовка на трасе"
952	Възстановителни работи	4 days	Mon 14.3.22	Thu 17.3.22	951FS-5 days	Екип "Възстановителни работи"
953	Проби и изпитания	1 day	Fri 18.3.22	Fri 18.3.22	952	Екип "Проби и изпитания"
954	**Кл.25 DMA 6 рек.**	**7 days**	**Fri 18.3.22**	**Thu 24.3.22**	**943**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
955	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Fri 18.3.22	Thu 24.3.22	943	Ръководител на работна група (звено)
956	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	4 days	Fri 18.3.22	Mon 21.3.22	955FS-7 days	Екип "Подготовка на трасе"
957	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	5 days	Fri 18.3.22	Tue 22.3.22	956FS-4 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
958	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	5 days	Fri 18.3.22	Tue 22.3.22	957FS-5 days	Екип "Монтажни работи"
959	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	4 days	Fri 18.3.22	Mon 21.3.22	958FS-5 days	Екип "Обратно засипване"
960	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Tue 22.3.22	Wed 23.3.22	959	Екип "Проби и изпитания"
961	**Възстановителни работи - кл. 25**	**7 days**	**Sat 19.3.22**	**Fri 25.3.22**	**950**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
962	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sat 19.3.22	Fri 25.3.22	950	Екип "Подготовка на трасе"
963	Възстановителни работи	5 days	Sat 19.3.22	Wed 23.3.22	962FS-7 days	Екип "Възстановителни работи"
964	Проби и изпитания	2 days	Thu 24.3.22	Fri 25.3.22	963	Екип "Проби и изпитания"
965	**Кл.26 DMA 6 рек.**	**8 days**	**Fri 25.3.22**	**Fri 1.4.22**	**954**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
966	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Fri 25.3.22	Fri 1.4.22	954	Ръководител на работна група (звено)
967	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	5 days	Fri 25.3.22	Tue 29.3.22	966FS-8 days	Екип "Подготовка на трасе"
968	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	6 days	Fri 25.3.22	Wed 30.3.22	967FS-5 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
969	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	6 days	Fri 25.3.22	Wed 30.3.22	968FS-6 days	Екип "Монтажни работи"
970	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	5 days	Sat 26.3.22	Wed 30.3.22	969FS-5 days	Екип "Обратно засипване"
971	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Thu 31.3.22	Fri 1.4.22	970	Екип "Проби и изпитания"
972	**Възстановителни работи - кл. 26**	**8 days**	**Sat 26.3.22**	**Sat 2.4.22**	**961**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
973	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sat 26.3.22	Sat 2.4.22	961	Екип "Подготовка на трасе"
[illegible]74	Възстановителни работи	6 days	Sat 26.3.22	Thu 31.3.22	973FS-8 days	Екип "Възстановителни работи"
[illegible]	Проби и изпитания	2 days	Fri 1.4.22	Sat 2.4.22	974	Екип "Проби и изпитания"
[illegible]6	**Кл.27 DMA 6 рек.**	**7 days**	**Fri 17.6.22**	**Thu 23.6.22**	**1172**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
977	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Fri 17.6.22	Thu 23.6.22	1172	Ръководител на работна група (звено)
978	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	4 days	Fri 17.6.22	Mon 20.6.22	977FS-7 days	Екип "Подготовка на трасе"
979	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	5 days	Fri 17.6.22	Tue 21.6.22	978FS-4 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
980	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	5 days	Fri 17.6.22	Tue 21.6.22	979FS-5 days	Екип "Монтажни работи"
981	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	4 days	Sat 18.6.22	Tue 21.6.22	980FS-4 days	Екип "Обратно засипване"
982	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Wed 22.6.22	Thu 23.6.22	981	Екип "Проби и изпитания"
[illegible]83	**Възстановителни работи - кл. 27**	**7 days**	**Sat 18.6.22**	**Fri 24.6.22**	**976FS-6 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 1**
[illegible]	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sat 18.6.22	Fri 24.6.22	976FS-6 days	Екип "Подготовка на трасе"
985	Възстановителни работи	5 days	Sat 18.6.22	Wed 22.6.22	984FS-7 days	Екип "Възстановителни работи"
986	Проби и изпитания	2 days	Thu 23.6.22	Fri 24.6.22	985	Екип "Проби и изпитания"
987	**Ниска зона**	**624 days**	**Tue 24.8.21**	**Tue 9.5.23**	**767**	
988	**Гл.Кол.I- дублиращ колектор**	**30 days**	**Tue 24.8.21**	**Wed 22.9.21**	**767**	**Работна група (звено) "Канализация "**
989	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	30 days	Tue 24.8.21	Wed 22.9.21	767	Ръководител на работна група (звено)
990	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	23 days	Tue 24.8.21	Wed 15.9.21	989FS-30 days	Екип "Подготовка на трасе"
991	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	29 days	Tue 24.8.21	Tue 21.9.21	990FS-23 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
992	Направа на подложка.Монтажни работи	24 days	Tue 24.8.21	Thu 16.9.21	991FS-29 days	Екип "Монтажни работи"
993	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	24 days	Sun 29.8.21	Tue 21.9.21	992FS-19 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
994	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	29 days	Tue 24.8.21	Tue 21.9.21	991FS-29 days	Екип "Обратно засипване"
995	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Wed 22.9.21	Wed 22.9.21	994	Екип "Проби и изпитания"
996	**Гл.Кол.I- дублиращ колектор**	**15 days**	**Thu 23.9.21**	**Thu 7.10.21**	**988**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 2**
997	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	15 days	Thu 23.9.21	Thu 7.10.21	988	Ръководител на работна група (звено)
998	Безизкопно полагане	13 days	Thu 23.9.21	Tue 5.10.21	997FS-15 days	Екип "Безизкопно полагане"
999	Проби и изпитания	2 days	Wed 6.10.21	Thu 7.10.21	998	Екип "Проби и изпитания"
1000	**Гл.Кол.I- дублиращ колектор**	**22 days**	**Fri 8.10.21**	**Fri 29.10.21**	**557**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1001	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	22 days	Fri 8.10.21	Fri 29.10.21	557	Ръководител на работна група (звено)
1002	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	15 days	Fri 8.10.21	Fri 22.10.21	1001FS-22 days	Екип "Подготовка на трасе"
1003	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	21 days	Fri 8.10.21	Thu 28.10.21	1002FS-15 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1004	Направа на подложка.Монтажни работи	16 days	Fri 8.10.21	Sat 23.10.21	1003FS-21 days	Екип "Монтажни работи"
1005	Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи	16 days	Wed 13.10.21	Thu 28.10.21	1004FS-11 days	Екип "Монолитни строителни конструкции"
1006	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	21 days	Fri 8.10.21	Thu 28.10.21	1003FS-21 days	Екип "Обратно засипване"
1007	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Fri 29.10.21	Fri 29.10.21	1006	Екип "Проби и изпитания"
1008	**Възстановителни работи - Гл. Кол. I - дублиращ колектор**	**19 days**	**Tue 12.10.21**	**Sat 30.10.21**	**1000FS-18 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1009	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	19 days	Tue 12.10.21	Sat 30.10.21	1000FS-18 days	Ръководител на работна група (звено)
1010	Възстановителни работи	15 days	Tue 12.10.21	Tue 26.10.21	1009FS-19 days	Екип "Възстановителни работи"
1011	Проби и изпитания	4 days	Wed 27.10.21	Sat 30.10.21	1010	Екип "Проби и изпитания"
1012	**Пр I-126**	**1 day**	**Sat 30.10.21**	**Sat 30.10.21**	**1000**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1013	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1000	Ръководител на работна група (звено)
1014	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1013FS-1 day	Екип "Подготовка на трасе"
1015	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1014FS-1 day	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1016	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1015FS-1 day	Екип "Монтажни работи"
1017	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1016FS-1 day	Екип "Обратно засипване"
1018	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sat 30.10.21	Sat 30.10.21	1017FS-1 day	Екип "Проби и изпитания"
1019	**Пр I-126**	**8 days**	**Sun 31.10.21**	**Sun 7.11.21**	**1012**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1020	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Sun 31.10.21	Sun 7.11.21	1012	Ръководител на работна група (звено)
1021	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	6 days	Sun 31.10.21	Fri 5.11.21	1020FS-8 days	Екип "Подготовка на трасе"
1022	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	7 days	Sun 31.10.21	Sat 6.11.21	1021FS-6 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1023	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	7 days	Sun 31.10.21	Sat 6.11.21	1022FS-7 days	Екип "Монтажни работи"
1024	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	6 days	Mon 1.11.21	Sat 6.11.21	1023FS-6 days	Екип "Обратно засипване"
1025	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Sun 7.11.21	Sun 7.11.21	1024	Екип "Проби и изпитания"
1026	**кл.10 ниска зона**	**7 days**	**Mon 8.11.21**	**Sun 14.11.21**	**586**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
1027	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Mon 8.11.21	Sun 14.11.21	586	Ръководител на работна група (звено)

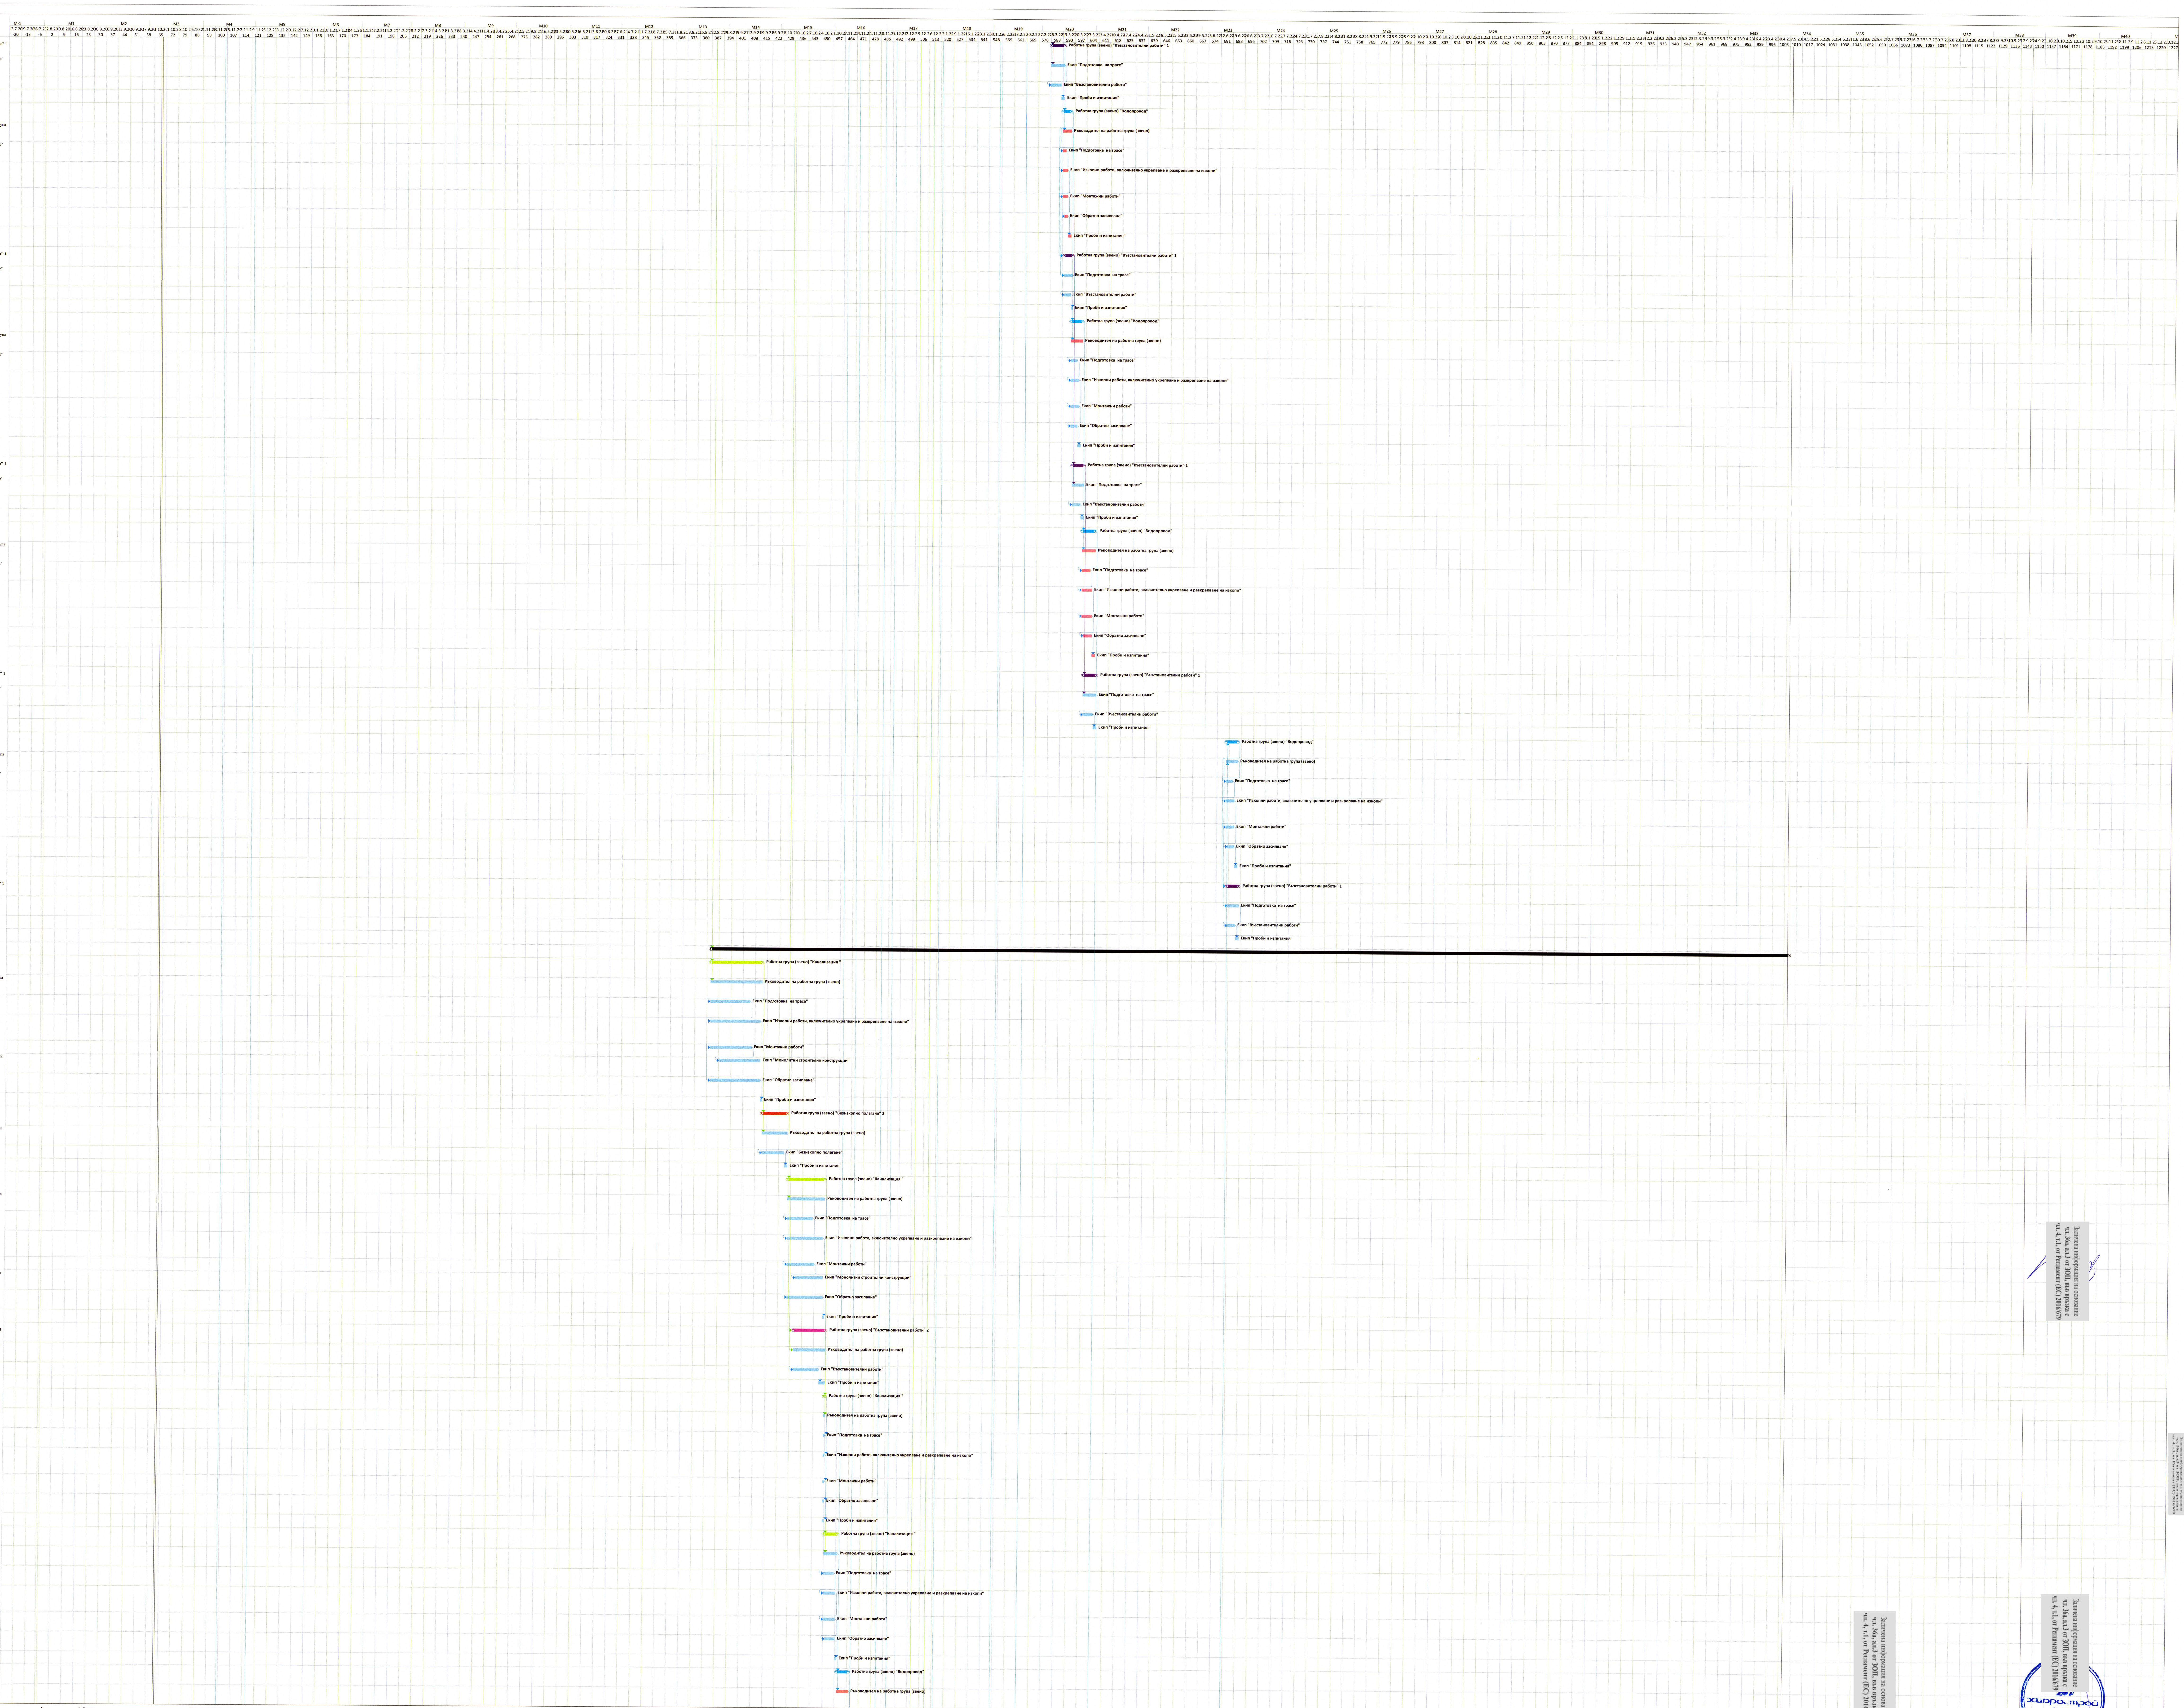

Поддейност/Задача | Нестроителна дейност/Събитие | Дейност | Обща продължителност на инвестиционното намерение | Критичен път

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради проява на неблагоприятни климатични условия.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис, печат: /......................./

000521
