*Обособена позиция № 1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"*

| ID | Етап/Фаза/Дейност | Продължителност | Начало | Край | Взаимовръзка | Ресурси |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 4 days | Mon 8.11.21 | Thu 11.11.21 | 1027FS-7 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1029 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 5 days | Mon 8.11.21 | Fri 12.11.21 | 1028FS-4 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| [illegible] | Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента | 5 days | Mon 8.11.21 | Fri 12.11.21 | 1029FS-5 days | Екип "Монтажни работи" |
| 31 | Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента. | 4 days | Tue 9.11.21 | Fri 12.11.21 | 1030FS-4 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1032 | Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване | 2 days | Sat 13.11.21 | Sun 14.11.21 | 1031 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1033 | **Пр I-126** | **8 days** | **Mon 15.11.21** | **Mon 22.11.21** | **1026** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1034 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 8 days | Mon 15.11.21 | Mon 22.11.21 | 1026 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1035 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 6 days | Mon 15.11.21 | Sat 20.11.21 | 1034FS-8 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1036 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 7 days | Mon 15.11.21 | Sun 21.11.21 | 1035FS-6 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1037 | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 7 days | Mon 15.11.21 | Sun 21.11.21 | 1036FS-7 days | Екип "Монтажни работи" |
| 8 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 6 days | Tue 16.11.21 | Sun 21.11.21 | 1037FS-6 days | Екип "Обратно засипване" |
| 9 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Mon 22.11.21 | Mon 22.11.21 | 1038 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1040 | **Пр I-126** | **7 days** | **Tue 23.11.21** | **Mon 29.11.21** | **1033** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1041 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 7 days | Tue 23.11.21 | Mon 29.11.21 | 1033 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1042 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 5 days | Tue 23.11.21 | Sat 27.11.21 | 1041FS-7 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1043 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 6 days | Tue 23.11.21 | Sun 28.11.21 | 1042FS-5 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1044 | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 6 days | Tue 23.11.21 | Sun 28.11.21 | 1043FS-6 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1045 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 5 days | Wed 24.11.21 | Sun 28.11.21 | 1044FS-5 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1046 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Mon 29.11.21 | Mon 29.11.21 | 1045 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1047 | **кл.9 ниска зона** | **6 days** | **Tue 30.11.21** | **Sun 5.12.21** | **1040;619** | **Работна група (звено) "Водопровод"** |
| 1048 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 6 days | Tue 30.11.21 | Sun 5.12.21 | 1040;619 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1049 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 3 days | Tue 30.11.21 | Thu 2.12.21 | 1048FS-6 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1050 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 4 days | Tue 30.11.21 | Fri 3.12.21 | 1049FS-3 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1051 | Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента | 4 days | Tue 30.11.21 | Fri 3.12.21 | 1050FS-4 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1052 | Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента. | 3 days | Wed 1.12.21 | Fri 3.12.21 | 1051FS-3 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1053 | Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване | 2 days | Sat 4.12.21 | Sun 5.12.21 | 1052 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1054 | **Възстановителни работи - ПР I-126, кл. 10 и кл. 9** | **6 days** | **Wed 1.12.21** | **Mon 6.12.21** | **1047FS-5 days** | **Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2** |
| 1055 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 6 days | Wed 1.12.21 | Mon 6.12.21 | 1047FS-5 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1056 | Възстановителни работи | 4 days | Wed 1.12.21 | Sat 4.12.21 | 1055FS-6 days | Екип "Възстановителни работи" |
| 1057 | Проби и изпитания | 2 days | Sun 5.12.21 | Mon 6.12.21 | 1056 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1058 | **Пр I-127** | **10 days** | **Tue 30.11.21** | **Thu 9.12.21** | **1040** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1059 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 10 days | Tue 30.11.21 | Thu 9.12.21 | 1040 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1060 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 8 days | Tue 30.11.21 | Tue 7.12.21 | 1059FS-10 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1061 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 9 days | Tue 30.11.21 | Wed 8.12.21 | 1060FS-8 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| [illegible] | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 9 days | Tue 30.11.21 | Wed 8.12.21 | 1061FS-9 days | Екип "Монтажни работи" |
| 63 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 8 days | Wed 1.12.21 | Wed 8.12.21 | 1062FS-8 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1064 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Thu 9.12.21 | Thu 9.12.21 | 1063 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1065 | **Пр I-127** | **6 days** | **Fri 10.12.21** | **Wed 15.12.21** | **1058** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1066 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 6 days | Fri 10.12.21 | Wed 15.12.21 | 1058 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1067 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 4 days | Fri 10.12.21 | Mon 13.12.21 | 1066FS-6 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1068 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 5 days | Fri 10.12.21 | Tue 14.12.21 | 1067FS-4 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1069 | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 5 days | Fri 10.12.21 | Tue 14.12.21 | 1068FS-5 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1070 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 4 days | Sat 11.12.21 | Tue 14.12.21 | 1069FS-4 days | Екип "Обратно засипване" |
| [illegible] | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Wed 15.12.21 | Wed 15.12.21 | 1070 | Екип "Проби и изпитания" |
| 072 | **Пр I-127** | **4 days** | **Thu 16.12.21** | **Sun 19.12.21** | **1065** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1073 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 4 days | Thu 16.12.21 | Sun 19.12.21 | 1065 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1074 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 2 days | Thu 16.12.21 | Fri 17.12.21 | 1073FS-4 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1075 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 3 days | Thu 16.12.21 | Sat 18.12.21 | 1074FS-2 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1076 | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 3 days | Thu 16.12.21 | Sat 18.12.21 | 1075FS-3 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1077 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 2 days | Fri 17.12.21 | Sat 18.12.21 | 1076FS-2 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1078 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Sun 19.12.21 | Sun 19.12.21 | 1077 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1079 | **кл.8 ниска зона** | **13 days** | **Mon 20.12.21** | **Sat 1.1.22** | **630** | **Работна група (звено) "Водопровод"** |
| 1080 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 13 days | Mon 20.12.21 | Sat 1.1.22 | 1072 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1081 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 10 days | Mon 20.12.21 | Wed 29.12.21 | 1080FS-13 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1082 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 11 days | Mon 20.12.21 | Thu 30.12.21 | 1081FS-10 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1083 | Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента | 11 days | Mon 20.12.21 | Thu 30.12.21 | 1082FS-11 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1084 | Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента. | 10 days | Tue 21.12.21 | Thu 30.12.21 | 1083FS-10 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1085 | Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване | 2 days | Fri 31.12.21 | Sat 1.1.22 | 1084 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1086 | **Възстановителни работи - ПР I-127 и кл. 8** | **13 days** | **Tue 21.12.21** | **Sun 2.1.22** | **1079FS-12 days** | **Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2** |
| 1087 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 13 days | Tue 21.12.21 | Sun 2.1.22 | 1079FS-12 days | Ръководител на работна група (звено) |
| 1088 | Възстановителни работи | 10 days | Tue 21.12.21 | Thu 30.12.21 | 1080FS-13 days | Екип "Възстановителни работи" |
| 1089 | Проби и изпитания | 3 days | Thu 30.12.21 | Sat 1.1.22 | 1081 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1090 | **Гл.Кол.III- дублиращи колектори** | **16 days** | **Tue 28.12.21** | **Wed 12.1.22** | **641** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1091 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 16 days | Tue 28.12.21 | Wed 12.1.22 | 641 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1092 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 14 days | Tue 28.12.21 | Mon 10.1.22 | 1091FS-16 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1093 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 15 days | Tue 28.12.21 | Tue 11.1.22 | 1092FS-14 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1094 | Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ. | 15 days | Tue 28.12.21 | Tue 11.1.22 | 1093FS-15 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1095 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 14 days | Wed 29.12.21 | Tue 11.1.22 | 1094FS-14 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1096 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Wed 12.1.22 | Wed 12.1.22 | 1095 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1097 | **Гл.Кол.III- дублиращи колектори** | **22 days** | **Thu 13.1.22** | **Thu 3.2.22** | **1090** | **Работна група (звено) "Канализация "** |
| 1098 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 22 days | Thu 13.1.22 | Thu 3.2.22 | 1090 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1099 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 15 days | Thu 13.1.22 | Thu 27.1.22 | 1098FS-22 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1100 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 21 days | Thu 13.1.22 | Wed 2.2.22 | 1099FS-15 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1101 | Направа на подложка.Монтажни работи | 15 days | Thu 13.1.22 | Thu 27.1.22 | 1100FS-21 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1102 | Изграждане на монолитни шахти и сглобяеми елементи | 11 days | Sun 23.1.22 | Wed 2.2.22 | 1101FS-5 days | Екип "Монолитни строителни конструкции" |
| 1103 | Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента | 21 days | Thu 13.1.22 | Wed 2.2.22 | 1101FS-15 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1104 | Изпитване и направа на видео - инспекция | 1 day | Thu 3.2.22 | Thu 3.2.22 | 1103 | Екип "Проби и изпитания" |
| 1105 | **кл.6 ниска зона** | **15 days** | **Fri 4.2.22** | **Fri 18.2.22** | **704** | **Работна група (звено) "Водопровод"** |
| 1106 | ВОД и обезопасяване на строителната площадка | 15 days | Fri 4.2.22 | Fri 18.2.22 | 704 | Ръководител на работна група (звено) |
| 1107 | Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки | 12 days | Fri 4.2.22 | Tue 15.2.22 | 1106FS-15 days | Екип "Подготовка на трасе" |
| 1108 | Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи | 13 days | Fri 4.2.22 | Wed 16.2.22 | 1107FS-12 days | Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи" |
| 1109 | Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента | 13 days | Fri 4.2.22 | Wed 16.2.22 | 1108FS-13 days | Екип "Монтажни работи" |
| 1110 | Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента. | 12 days | Sat 5.2.22 | Wed 16.2.22 | 1109FS-12 days | Екип "Обратно засипване" |
| 1111 | Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване | 2 days | Thu 17.2.22 | Fri 18.2.22 | 1110 | Екип "Проби и изпитания" |

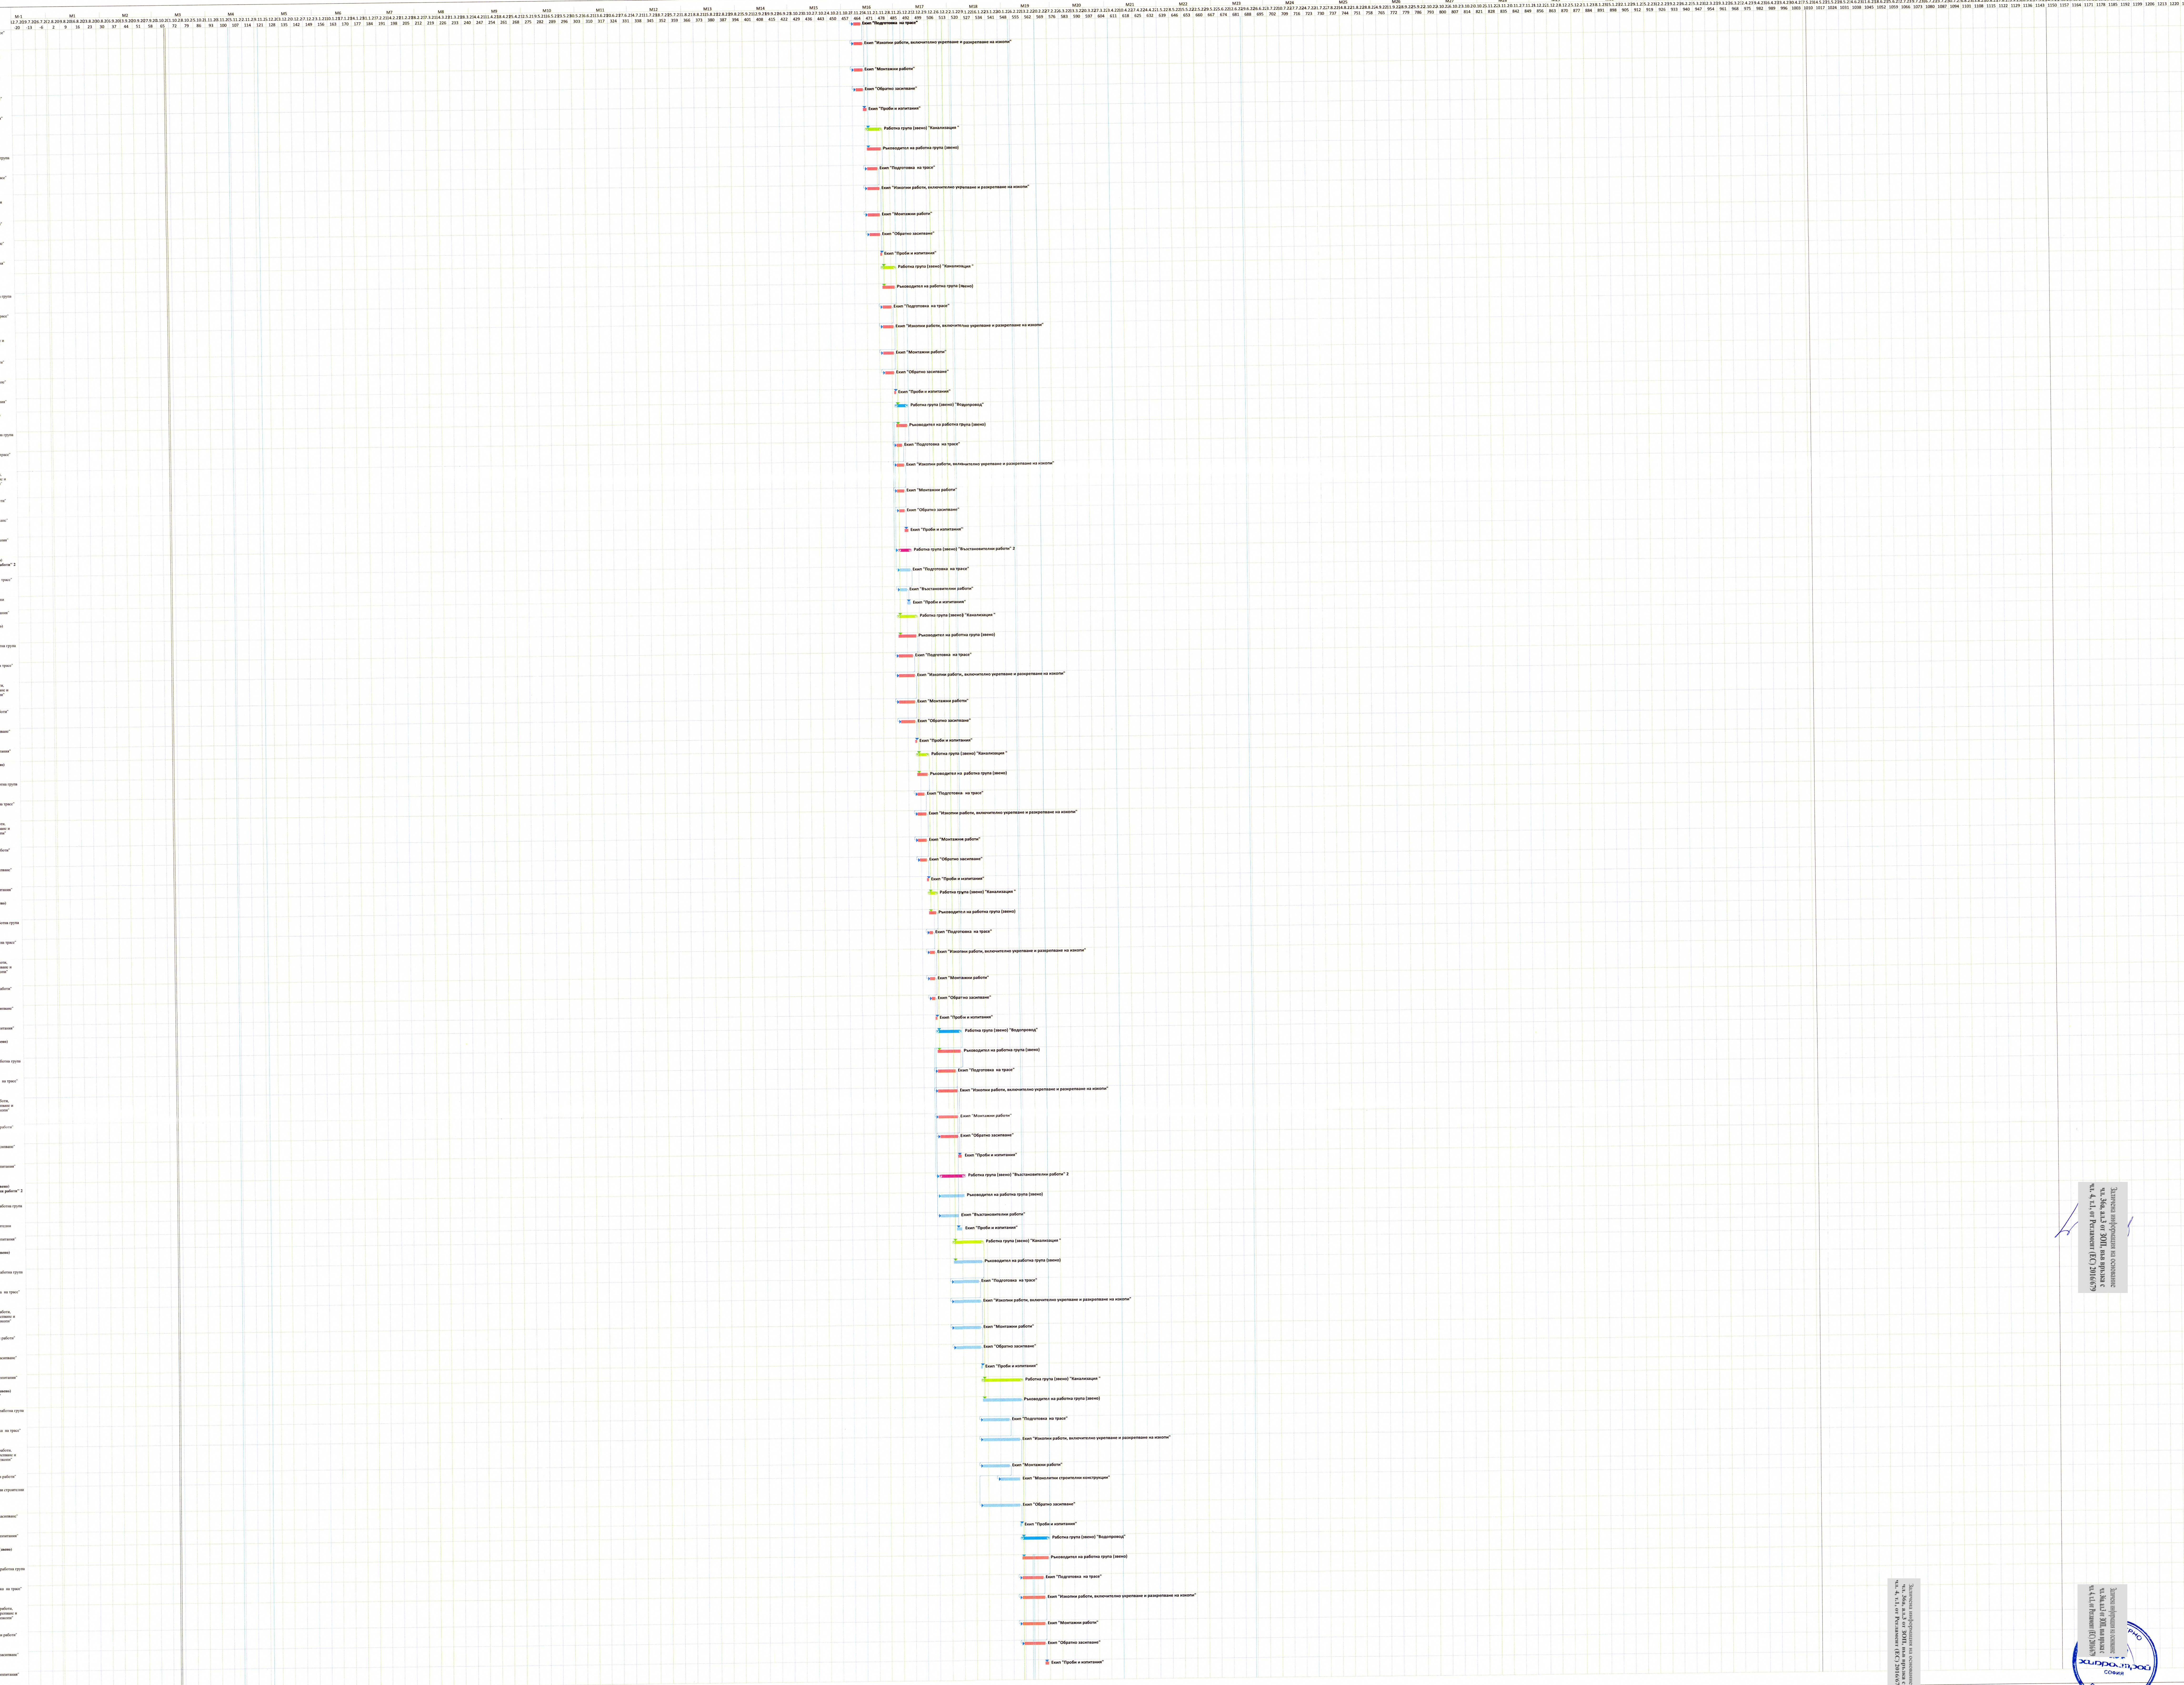

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Поддейност/Задача — Нестроителна дейност/Събитие — Дейност — Обща продължителност на инвестиционното намерение — Критичен път

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради проява на неблагоприятни климатични условия.



000524
