Обособена позиция №1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"

ID	Етап/Фаза/Дейност	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка	Ресурси
1112	**Възстановителни работи - Гл. Кол. III - дублиращи колектори и кл. 6**	**7 days**	**Sun 13.2.22**	**Sat 19.2.22**	**1105FS-6 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1113	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	7 days	Sun 13.2.22	Sat 19.2.22	1105FS-6 days	Ръководител на работна група (звено)
[illegible]	Възстановителни работи	5 days	Sun 13.2.22	Thu 17.2.22	1113FS-7 days	Екип "Възстановителни работи"
[illegible]	Проби и изпитания	2 days	Fri 18.2.22	Sat 19.2.22	1114	Екип "Проби и изпитания"
1116	**Пр III-13**	**22 days**	**Fri 4.2.22**	**Fri 25.2.22**	**1097**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1117	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	22 days	Fri 4.2.22	Fri 25.2.22	1097	Ръководител на работна група (звено)
1118	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	20 days	Fri 4.2.22	Wed 23.2.22	1117FS-22 days	Екип "Подготовка на трасе"
1119	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	21 days	Fri 4.2.22	Thu 24.2.22	1118FS-20 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1120	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	21 days	Fri 4.2.22	Thu 24.2.22	1119FS-21 days	Екип "Монтажни работи"
1121	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	20 days	Sat 5.2.22	Thu 24.2.22	1120FS-20 days	Екип "Обратно засипване"
1122	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Fri 25.2.22	Fri 25.2.22	1121	Екип "Подготовка на трасе"
[illegible]3	**Пр III-13**	**4 days**	**Sat 26.2.22**	**Tue 1.3.22**	**1116**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
[illegible]	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	4 days	Sat 26.2.22	Tue 1.3.22	1116	Ръководител на работна група (звено)
1125	Безизкопно полагане	3 days	Sat 26.2.22	Mon 28.2.22	1124FS-4 days	Екип "Безизкопно полагане"
1126	Проби и изпитания	1 day	Tue 1.3.22	Tue 1.3.22	1125	Екип "Проби и изпитания"
1127	**Пр III-13**	**31 days**	**Wed 2.3.22**	**Fri 1.4.22**	**1123**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1128	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	31 days	Wed 2.3.22	Fri 1.4.22	1123	Ръководител на работна група (звено)
1129	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	29 days	Wed 2.3.22	Wed 30.3.22	1128FS-31 days	Екип "Подготовка на трасе"
1130	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	30 days	Wed 2.3.22	Thu 31.3.22	1129FS-29 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1131	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	30 days	Wed 2.3.22	Thu 31.3.22	1130FS-30 days	Екип "Монтажни работи"
1132	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	29 days	Thu 3.3.22	Thu 31.3.22	1131FS-29 days	Екип "Обратно засипване"
1133	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Fri 1.4.22	Fri 1.4.22	1132	Екип "Проби и изпитания"
1134	**кл.7 ниска зона**	**20 days**	**Sat 2.4.22**	**Thu 21.4.22**	**965**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
1135	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	20 days	Sat 2.4.22	Thu 21.4.22	965	Екип "Подготовка на трасе"
1136	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	17 days	Sat 2.4.22	Mon 18.4.22	1135FS-20 days	Екип "Подготовка на трасе"
1137	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	18 days	Sat 2.4.22	Tue 19.4.22	1136FS-17 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1138	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	18 days	Sat 2.4.22	Tue 19.4.22	1137FS-18 days	Екип "Монтажни работи"
1139	Въздушно преминаване	4 days	Fri 15.4.22	Mon 18.4.22	1138FS-5 days	Екип "Въздушно преминаване"
1140	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	17 days	Sat 2.4.22	Mon 18.4.22	1138FS-18 days	Екип "Обратно засипване"
1141	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Tue 19.4.22	Wed 20.4.22	1140	Екип "Проби и изпитания"
1142	**Възстановителни работи - ПР III-13 и кл. 7**	**11 days**	**Tue 12.4.22**	**Fri 22.4.22**	**1134FS-10 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1143	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	11 days	Tue 12.4.22	Fri 22.4.22	1134FS-10 days	Ръководител на работна група (звено)
1144	Възстановителни работи	9 days	Tue 12.4.22	Wed 20.4.22	1143FS-11 days	Екип "Възстановителни работи"
1145	Проби и изпитания	2 days	Thu 21.4.22	Fri 22.4.22	1144	Екип "Проби и изпитания"
1146	**Пр III-11**	**20 days**	**Sat 2.4.22**	**Thu 21.4.22**	**1127**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1147	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	20 days	Sat 2.4.22	Thu 21.4.22	1127	Ръководител на работна група (звено)
[illegible]8	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	18 days	Sat 2.4.22	Tue 19.4.22	1147FS-20 days	Екип "Подготовка на трасе"
[illegible]9	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	19 days	Sat 2.4.22	Wed 20.4.22	1148FS-18 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1150	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	19 days	Sat 2.4.22	Wed 20.4.22	1149FS-19 days	Екип "Монтажни работи"
1151	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	18 days	Sun 3.4.22	Wed 20.4.22	1150FS-18 days	Екип "Обратно засипване"
1152	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Thu 21.4.22	Thu 21.4.22	1151	Екип "Проби и изпитания"
1153	**кл.5 ниска зона**	**20 days**	**Fri 22.4.22**	**Wed 11.5.22**	**1134**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
1154	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	20 days	Fri 22.4.22	Wed 11.5.22	1134	Ръководител на работна група (звено)
1155	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	4 days	Thu 5.5.22	Sun 8.5.22	1154FS-7 days	Екип "Подготовка на трасе"
1156	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	5 days	Thu 5.5.22	Mon 9.5.22	1155FS-4 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
[illegible]	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	5 days	Thu 5.5.22	Mon 9.5.22	1156FS-5 days	Екип "Монтажни работи"
1158	Въздушно преминаване	3 days	Fri 6.5.22	Sun 8.5.22	1157FS-4 days	Екип "Въздушно преминаване"
1159	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	4 days	Fri 6.5.22	Mon 9.5.22	1157FS-4 days	Екип "Обратно засипване"
1160	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Tue 10.5.22	Wed 11.5.22	1159	Екип "Проби и изпитания"
1161	**Пр III-11**	**4 days**	**Thu 12.5.22**	**Sun 15.5.22**	**1153**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
1162	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	4 days	Thu 12.5.22	Sun 15.5.22	1153	Ръководител на работна група (звено)
1163	Безизкопно полагане	3 days	Thu 12.5.22	Sat 14.5.22	1162FS-4 days	Екип "Безизкопно полагане"
1164	Проби и изпитания	1 day	Sun 15.5.22	Sun 15.5.22	1163	Екип "Проби и изпитания"
1165	**Пр III-11**	**20 days**	**Mon 16.5.22**	**Sat 4.6.22**	**1161**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1166	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	20 days	Mon 16.5.22	Sat 4.6.22	1161	Ръководител на работна група (звено)
1167	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	18 days	Mon 16.5.22	Thu 2.6.22	1166FS-20 days	Екип "Подготовка на трасе"
1168	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	19 days	Mon 16.5.22	Fri 3.6.22	1167FS-18 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1169	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	19 days	Mon 16.5.22	Fri 3.6.22	1168FS-19 days	Екип "Монтажни работи"
1170	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	18 days	Mon 16.5.22	Thu 2.6.22	1169FS-19 days	Екип "Обратно засипване"
1171	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Fri 3.6.22	Fri 3.6.22	1170	Екип "Проби и изпитания"
1172	**кл.5 ниска зона**	**12 days**	**Sun 5.6.22**	**Thu 16.6.22**	**1165**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
1173	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	12 days	Sun 5.6.22	Thu 16.6.22	1165	Ръководител на работна група (звено)
1174	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	9 days	Sun 5.6.22	Mon 13.6.22	1173FS-12 days	Екип "Подготовка на трасе"
1175	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	10 days	Sun 5.6.22	Tue 14.6.22	1174FS-9 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1176	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	10 days	Sun 5.6.22	Tue 14.6.22	1175FS-10 days	Екип "Монтажни работи"
1177	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	9 days	Mon 6.6.22	Tue 14.6.22	1176FS-9 days	Екип "Обратно засипване"
1178	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Wed 15.6.22	Thu 16.6.22	1177	Екип "Проби и изпитания"
1179	**Пр III-11**	**14 days**	**Fri 17.6.22**	**Thu 30.6.22**	**1172**	**Работна група (звено) "Канализация "**
1180	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	14 days	Fri 17.6.22	Thu 30.6.22	1172	Ръководител на работна група (звено)
1181	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	12 days	Fri 17.6.22	Tue 28.6.22	1180FS-14 days	Екип "Подготовка на трасе"
1182	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	13 days	Fri 17.6.22	Wed 29.6.22	1181FS-12 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1183	Направа на подложка.Монтажни работи, включително направа на РШ.	13 days	Fri 17.6.22	Wed 29.6.22	1182FS-13 days	Екип "Монтажни работи"
1184	Обратно засипване, включително полагане на сигнална лента	12 days	Sat 18.6.22	Wed 29.6.22	1183FS-12 days	Екип "Обратно засипване"
1185	Изпитване и направа на видео - инспекция	1 day	Thu 30.6.22	Thu 30.6.22	1184	Екип "Проби и изпитания"
1186	**кл.5 ниска зона**	**12 days**	**Fri 1.7.22**	**Tue 12.7.22**	**1179**	**Работна група (звено) "Водопровод"**
1187	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	12 days	Fri 1.7.22	Tue 12.7.22	1179	Ръководител на работна група (звено)
1188	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	9 days	Fri 1.7.22	Sat 9.7.22	1187FS-12 days	Екип "Подготовка на трасе"
1189	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	10 days	Fri 1.7.22	Sun 10.7.22	1188FS-9 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1190	Направа на подложка. Монтажни работи. Полагане на детекторна лента	10 days	Fri 1.7.22	Sun 10.7.22	1189FS-10 days	Екип "Монтажни работи"
1191	Предварително изпитване на якост. Обратно засипване. Полагане на сигнална лента.	9 days	Sat 2.7.22	Sun 10.7.22	1190FS-9 days	Екип "Обратно засипване"
1192	Изпитване на напор, промиване, дезинфекция и повторно промиване	2 days	Mon 11.7.22	Tue 12.7.22	1191	Екип "Проби и изпитания"
1193	**Възстановителни работи - ПР III-11 и кл. 5**	**8 days**	**Wed 6.7.22**	**Wed 13.7.22**	**1186FS-7 days**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1194	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	8 days	Wed 6.7.22	Wed 13.7.22	1186FS-7 days	Ръководител на работна група (звено)
1195	Възстановителни работи	6 days	Wed 6.7.22	Mon 11.7.22	1194FS-8 days	Екип "Възстановителни работи"
1196	Проби и изпитания	2 days	Tue 12.7.22	Wed 13.7.22	1195	Екип "Проби и изпитания"
1197	**Гл.Кол.III- дублиращи колектори**	**10 days**	**Fri 1.7.22**	**Sun 10.7.22**	**1179**	**Работна група (звено) "Канализация "**

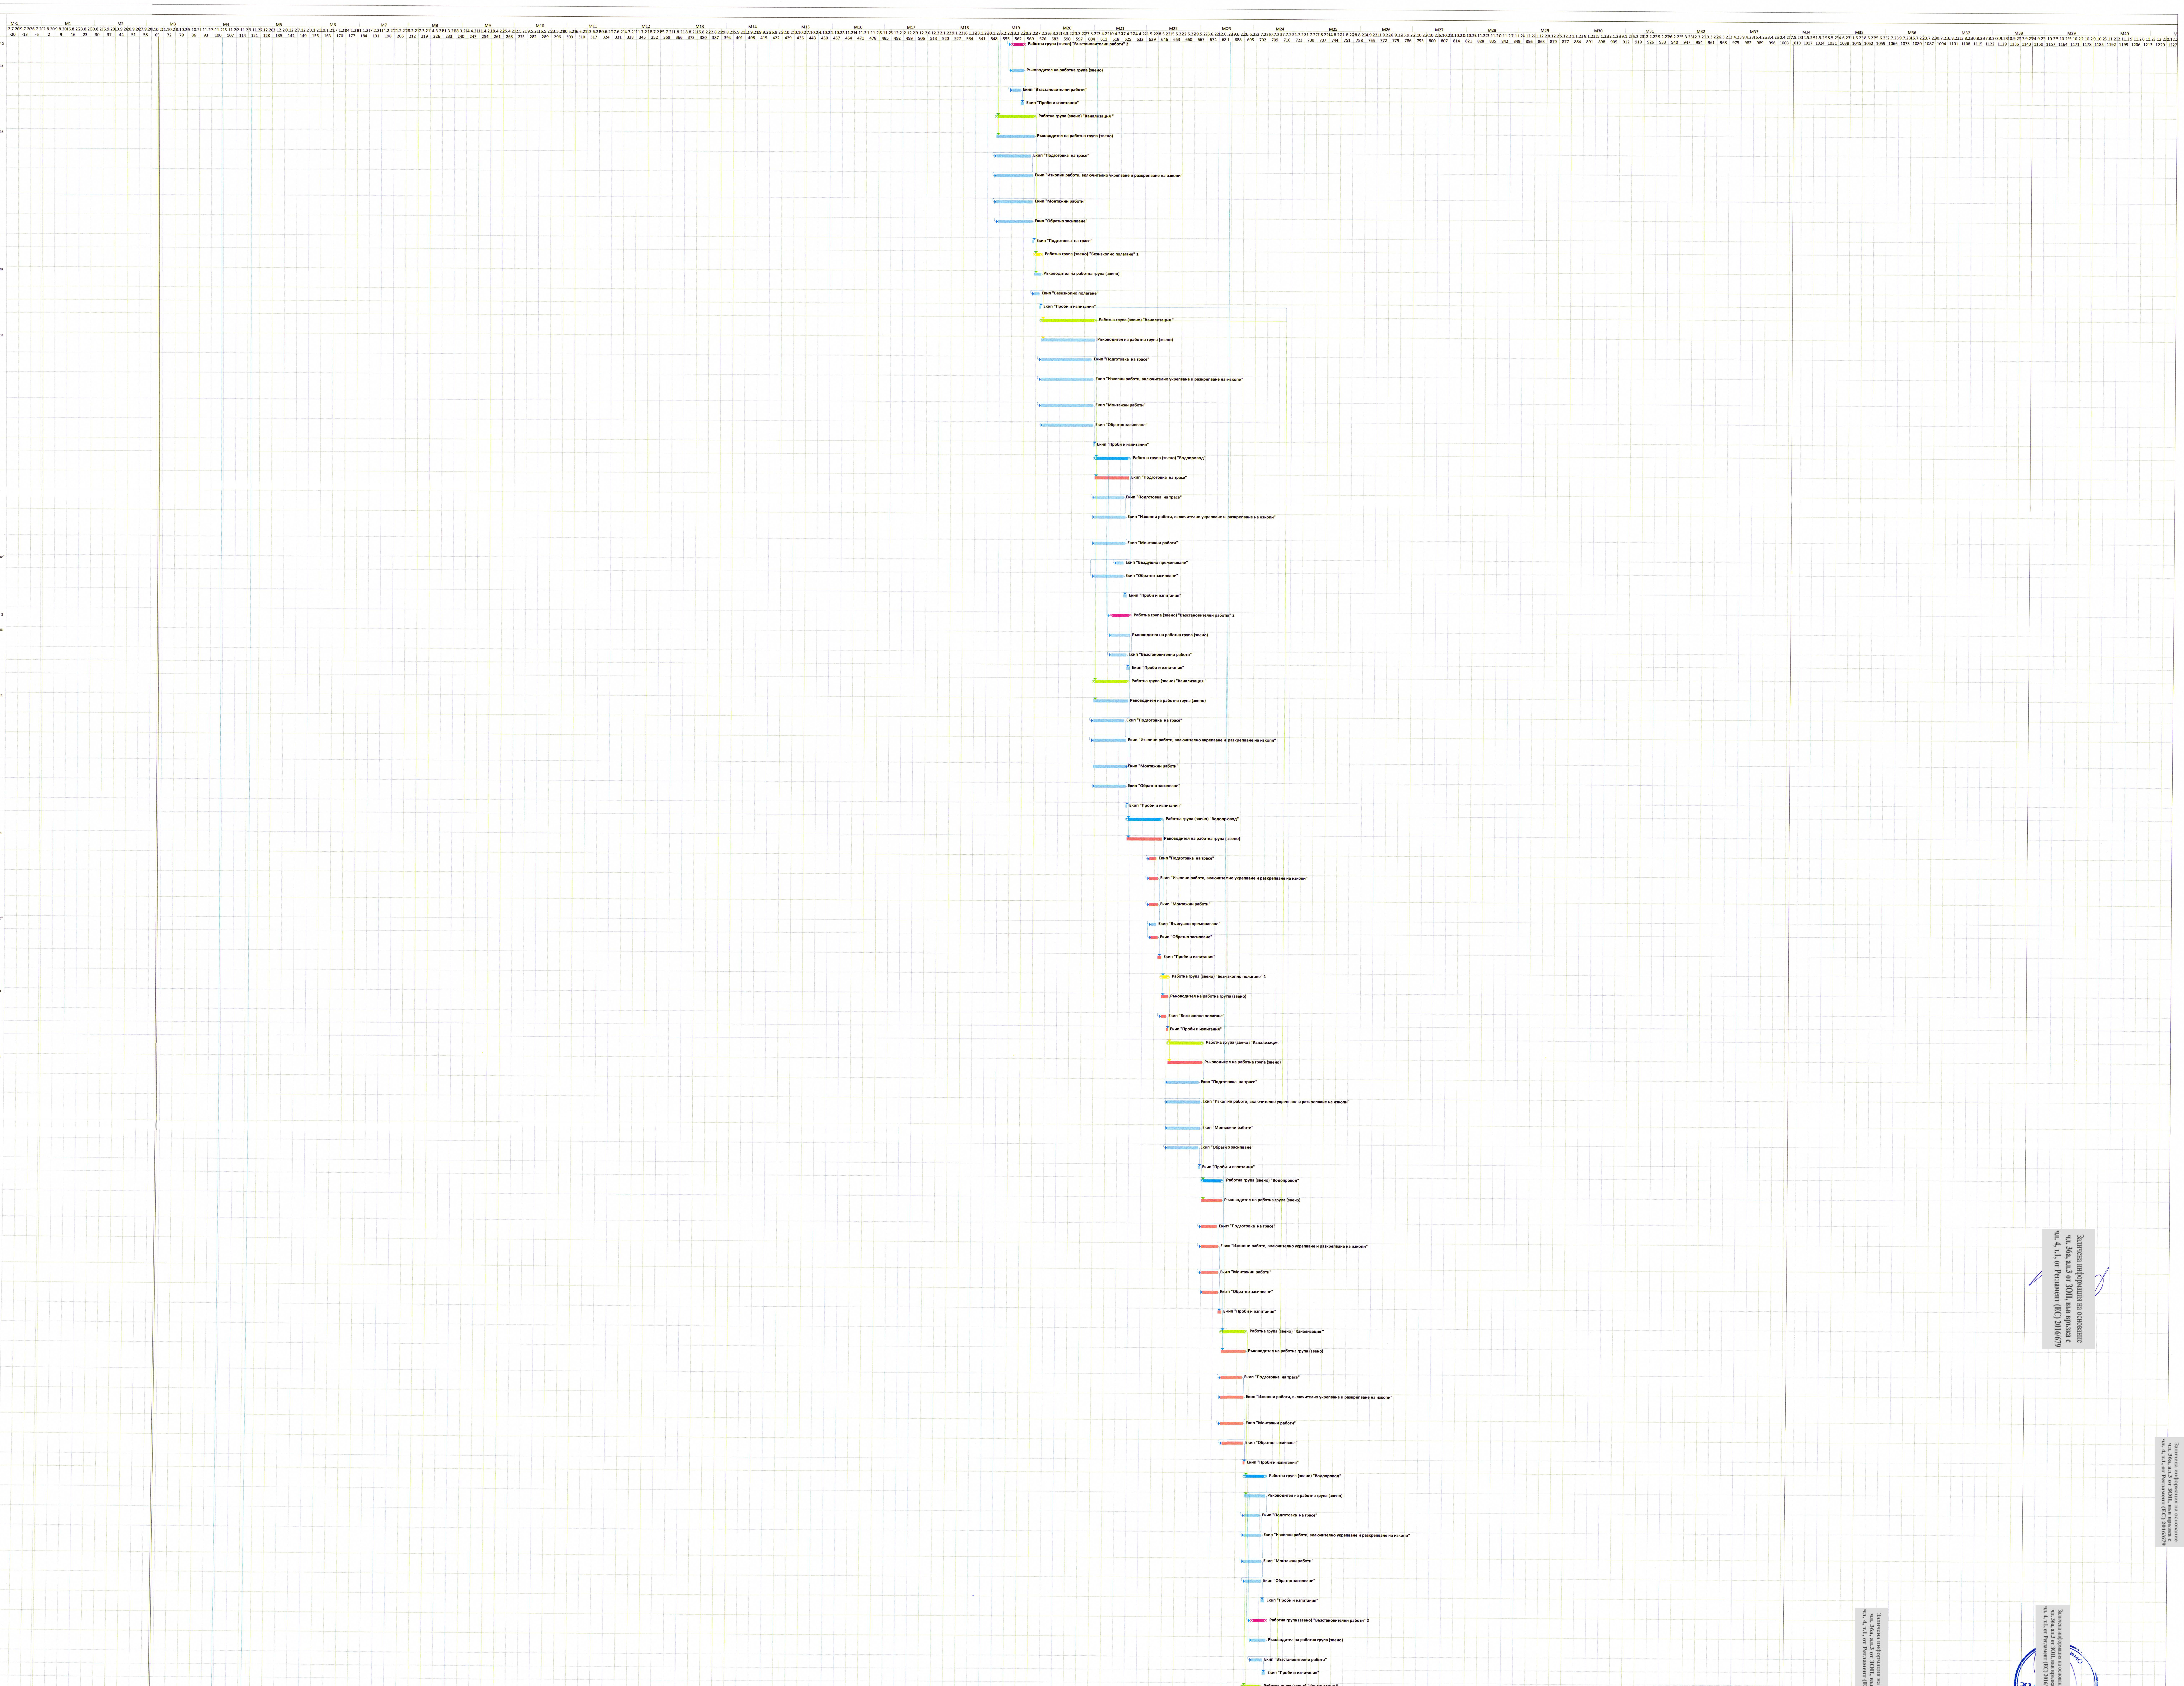

Поддейност/Задача | Нестроителна дейност/Събитие | Дейност | Обща продължителност на инвестиционното намерение | Критичен път

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради проява на неблагоприятни климатични условия.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис, печат: /......................./

C00522
