Обособена позиция №1: "Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Стара Загора - южна част"

ID	Етап/Фаза/Дейност	Продължителност	Начало	Край	Взаимовръзка	Ресурси
1465	**Възстановителни работи - ПР III-19**	**3 days**	**Fri 28.7.23**	**Sun 30.7.23**	**1458**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1466	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Fri 28.7.23	Sun 30.7.23	1458	Ръководител на работна група (звено)
1467	Възстановителни работи	2 days	Fri 28.7.23	Sat 29.7.23	1466FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
[illegible]	Проби и изпитания	1 day	Sun 30.7.23	Sun 30.7.23	1467	Екип "Проби и изпитания"
[illegible]	**Пр III-21**	**10 days**	**Fri 28.7.23**	**Sun 6.8.23**	**1458**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
1470	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	10 days	Fri 28.7.23	Sun 6.8.23	1458	Ръководител на работна група (звено)
1471	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Fri 28.7.23	Sun 30.7.23	1470FS-10 days	Екип "Подготовка на трасе"
1472	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Fri 28.7.23	Mon 31.7.23	1471FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1473	Безизкопно полагане	5 days	Sat 29.7.23	Wed 2.8.23	1472FS-3 days	Екип "Безизкопно полагане"
1474	Обратно засипване	2 days	Thu 3.8.23	Fri 4.8.23	1473	Екип "Обратно засипване"
1475	Проби и изпитания	2 days	Sat 5.8.23	Sun 6.8.23	1474	Екип "Проби и изпитания"
1476	**Възстановителни работи - ПР III-21**	**3 days**	**Mon 7.8.23**	**Wed 9.8.23**	**1469**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
[illegible]	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Mon 7.8.23	Wed 9.8.23	1469	Ръководител на работна група (звено)
[illegible]	Възстановителни работи	2 days	Mon 7.8.23	Tue 8.8.23	1477FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
1479	Проби и изпитания	1 day	Wed 9.8.23	Wed 9.8.23	1478	Екип "Проби и изпитания"
1480	**Пр III-22**	**10 days**	**Mon 7.8.23**	**Wed 16.8.23**	**1469**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
1481	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	10 days	Mon 7.8.23	Wed 16.8.23	1469	Ръководител на работна група (звено)
1482	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Mon 7.8.23	Wed 9.8.23	1481FS-10 days	Екип "Подготовка на трасе"
1483	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Mon 7.8.23	Thu 10.8.23	1482FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1484	Безизкопно полагане	5 days	Tue 8.8.23	Sat 12.8.23	1483FS-3 days	Екип "Безизкопно полагане"
1485	Обратно засипване	2 days	Sun 13.8.23	Mon 14.8.23	1484	Екип "Обратно засипване"
1486	Проби и изпитания	2 days	Tue 15.8.23	Wed 16.8.23	1485	Екип "Проби и изпитания"
1487	**Възстановителни работи - ПР III-22**	**3 days**	**Thu 17.8.23**	**Sat 19.8.23**	**1480**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1488	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Thu 17.8.23	Sat 19.8.23	1480	Ръководител на работна група (звено)
1489	Възстановителни работи	2 days	Thu 17.8.23	Fri 18.8.23	1488FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
1490	Проби и изпитания	1 day	Sat 19.8.23	Sat 19.8.23	1489	Екип "Проби и изпитания"
1491	**Пр III-23**	**10 days**	**Thu 17.8.23**	**Sat 26.8.23**	**1480**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
1492	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	10 days	Thu 17.8.23	Sat 26.8.23	1480	Ръководител на работна група (звено)
1493	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Thu 17.8.23	Sat 19.8.23	1492FS-10 days	Екип "Подготовка на трасе"
1494	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Thu 17.8.23	Sun 20.8.23	1493FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1495	Безизкопно полагане	5 days	Fri 18.8.23	Tue 22.8.23	1494FS-3 days	Екип "Безизкопно полагане"
1496	Обратно засипване	2 days	Wed 23.8.23	Thu 24.8.23	1495	Екип "Обратно засипване"
1497	Проби и изпитания	2 days	Fri 25.8.23	Sat 26.8.23	1496	Екип "Проби и изпитания"
1498	**Възстановителни работи - ПР III-23**	**3 days**	**Sun 27.8.23**	**Tue 29.8.23**	**1491**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1499	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Sun 27.8.23	Tue 29.8.23	1491	Ръководител на работна група (звено)
1500	Възстановителни работи	2 days	Sun 27.8.23	Mon 28.8.23	1499FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
1501	Проби и изпитания	1 day	Tue 29.8.23	Tue 29.8.23	1500	Екип "Проби и изпитания"
1502	**Пр III-24**	**10 days**	**Sun 27.8.23**	**Tue 5.9.23**	**1491**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
1503	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	10 days	Sun 27.8.23	Tue 5.9.23	1491	Ръководител на работна група (звено)
[illegible]	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Sun 27.8.23	Tue 29.8.23	1503FS-10 days	Екип "Подготовка на трасе"
[illegible]	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Sun 27.8.23	Wed 30.8.23	1504FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1506	Безизкопно полагане	5 days	Mon 28.8.23	Fri 1.9.23	1505FS-3 days	Екип "Безизкопно полагане"
1507	Обратно засипване	2 days	Sat 2.9.23	Sun 3.9.23	1506	Екип "Обратно засипване"
1508	Проби и изпитания	2 days	Mon 4.9.23	Tue 5.9.23	1507	Екип "Проби и изпитания"
1509	**Възстановителни работи - ПР III-24**	**3 days**	**Wed 6.9.23**	**Fri 8.9.23**	**1502**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1510	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Wed 6.9.23	Fri 8.9.23	1502	Ръководител на работна група (звено)
1511	Възстановителни работи	2 days	Wed 6.9.23	Thu 7.9.23	1510FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
1512	Проби и изпитания	1 day	Fri 8.9.23	Fri 8.9.23	1511	Екип "Проби и изпитания"
1513	**Пр III-54**	**10 days**	**Wed 6.9.23**	**Fri 15.9.23**	**1502**	**Работна група (звено) "Безизкопно полагане" 1**
[illegible]	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	10 days	Wed 6.9.23	Fri 15.9.23	1502	Ръководител на работна група (звено)
[illegible]	Почистване и подготовка на трасе, включително разваляне на настилки	3 days	Wed 6.9.23	Fri 8.9.23	1514FS-10 days	Екип "Подготовка на трасе"
1516	Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи	4 days	Wed 6.9.23	Sat 9.9.23	1515FS-3 days	Екип "Изкопни работи, включително укрепване и разкрепване на изкопи"
1517	Безизкопно полагане	5 days	Thu 7.9.23	Mon 11.9.23	1516FS-3 days	Екип "Безизкопно полагане"
1518	Обратно засипване	2 days	Tue 12.9.23	Wed 13.9.23	1517	Екип "Обратно засипване"
1519	Проби и изпитания	2 days	Thu 14.9.23	Fri 15.9.23	1518	Екип "Проби и изпитания"
1520	**Възстановителни работи - ПР III-54**	**3 days**	**Sat 16.9.23**	**Mon 18.9.23**	**1513**	**Работна група (звено) "Възстановителни работи" 2**
1521	ВОД и обезопасяване на строителната площадка	3 days	Sat 16.9.23	Mon 18.9.23	1513	Ръководител на работна група (звено)
1522	Възстановителни работи	2 days	Sat 16.9.23	Sun 17.9.23	1521FS-3 days	Екип "Възстановителни работи"
1523	Проби и изпитания	1 day	Mon 18.9.23	Mon 18.9.23	1522	Екип "Проби и изпитания"
1524	**Демобилизация на работни групи (звена)**	2 days	Tue 19.9.23	Wed 20.9.23	1520	Технически ръководител
1525	**Оросяване на улиците против запрашаване по време на изпълнението на строително-монтажните работи**	1037 days	Mon 16.11.20	Mon 18.9.23	70SS	Работна група (звено) "Оросяване"
1526	**Почистване на строителната площадка**	1037 days	Mon 16.11.20	Mon 18.9.23	70SS	Работна група (звено) "Почистване"
1527	**Окончателно почистване на строителната площадка и възстановяване първоначалния й вид**	2 days	Thu 21.9.23	Fri 22.9.23	1524	Работна група (звено) "Почистване"
1528	**Съставяне на документация съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (с изкл. На Обр. № 2а и Обр. № 15)**	1023 days	Mon 30.11.20	Mon 18.9.23	70	Експерт ПТО;Технически ръководител
1529	**Съставяне и поддържане на езекутивна документация**	1023 days	Mon 30.11.20	Mon 18.9.23	70	Експерт ПТО;Технически ръководител
1530	**ФАЗА 3: Възстановяване първоначалния вид на строителните площадки, изготвяне и предаване на строителни книжа до комисия за Акт № 15**	**8 days**	**Sat 23.9.23**	**Sat 30.9.23**	**68**	
1531	Разваляне на временна база с прилежащо депо за доставка на оборудване и строителни материали. Демобилизация	7 days	Sat 23.9.23	Fri 29.9.23	68	Технически ръководител
1532	Предаване на завършена екзекутивна документация и входиране на данни, съгласно ЗКИР	7 days	Sat 23.9.23	Fri 29.9.23	1529	Експерт ПТО
1533	Подписване на Протокол Обр. № 15	1 day	Sat 30.9.23	Sat 30.9.23	1532	Технически ръководител
1534	**ЕТАП 3: Упражняване на Авторски надзор**	**1085 days**	**Sun 11.10.20**	**Sat 30.9.23**	**59SS**	
1535	Геодезическо заснемане и изготвяне на документация по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР	1035 days	Mon 30.11.20	Sat 30.9.23	70	Проектантски екип
1536	Дейности по проверка Протоколи, наблюдени на строежа, изработване и съгласуване на проектни промени, заверка на екзекутивна документация	1085 days	Sun 11.10.20	Sat 30.9.23	59SS	Проектантски екип

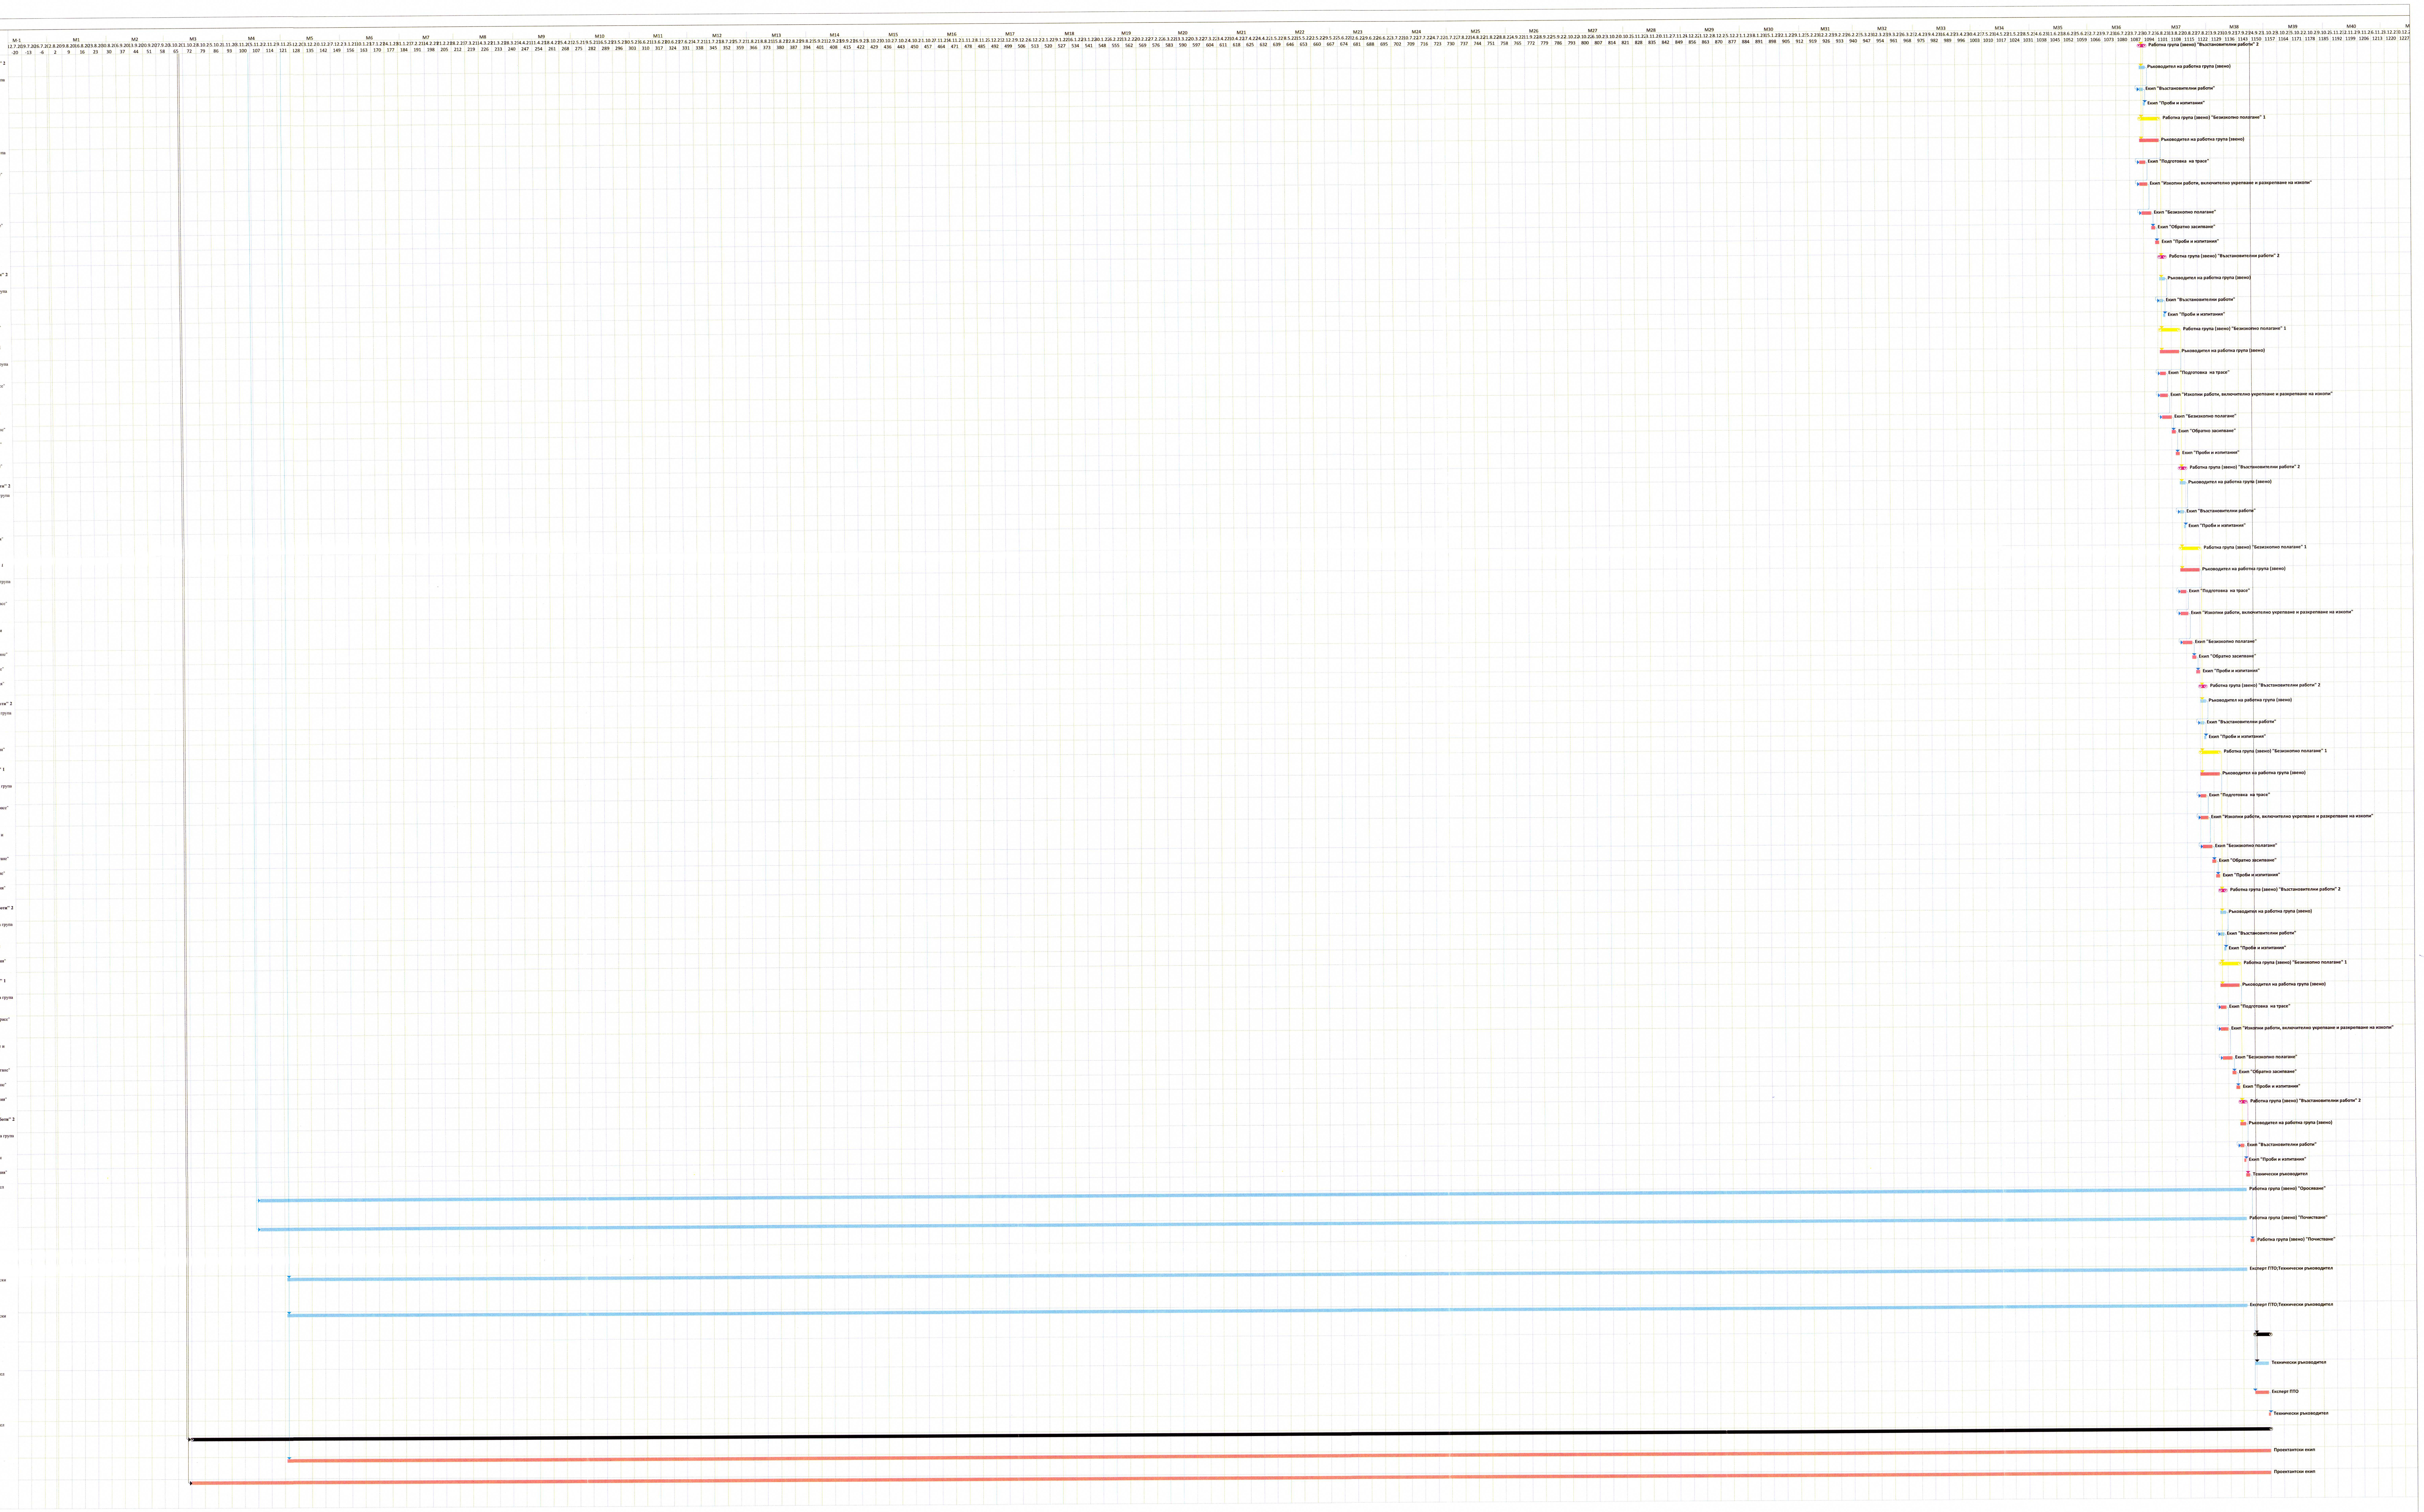

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис, печат: /......./

00052

Поддейност/Задача | Нестроителна дейност/Събитие | Дейност | Обща продължителност на инвестиционното намерение | Критичен път

*Забележка: Във времевите рамки на изпълняваните строително-монтажни работи са предвидени дни за прекъсване на изпълнението, поради прояви на неблагоприятни климатични условия.
